




आव २०७८/७९ को
वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठी





प्रस्तुति

भक्तपुर नगरपालिका, भक्तपुर

स्थान : जिसस भक्तपुर

मिति : २०७९।

भक्तपुर नगरपालिकाको परिचय :

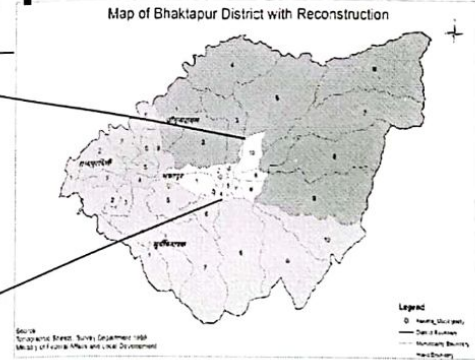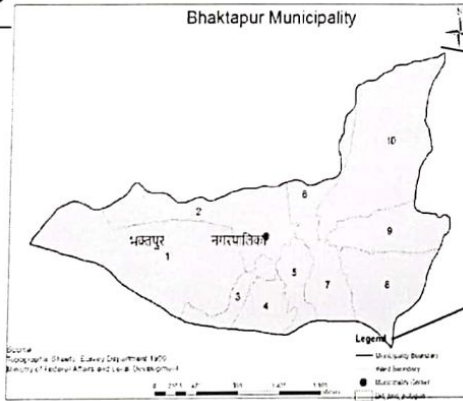


- भक्तपुर जिल्लाको मध्यभागमा अबस्थित
- नेपालको सानो जिल्लाको सानो नगरपालिका
- क्षेत्रफल: ६.८८ वर्ग कि.मी.
- १० वडा विभाजित
- ८ औं शताब्दीमा स्थापित ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक नगर
- सन् १९७९ मा भक्तपुर दरबार स्क्वायर समेतको क्षेत्र विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्र
- सम्पदा संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सरसफाई अभियानमा नमूना



भक्तपुर नगरपालिका कार्यालयको संगठन स्वरूप

संगठन विकास तथा व्यवस्थापन भवनमा अतिरिक्त कार्यस्थल - भक्तपुर नगरपालिका, २०६१ भाद्रमा

म.स. संविधान २०७२/७३ का अनुसार

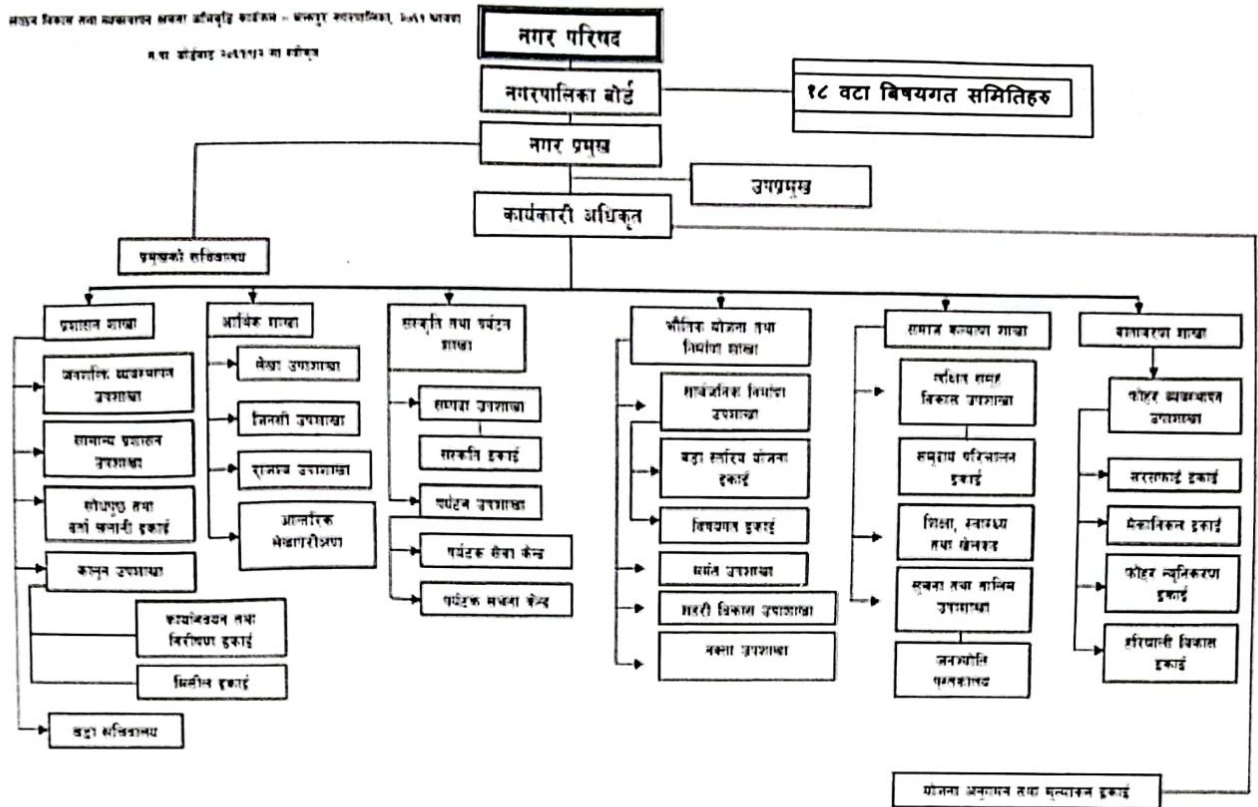

संस्थागत पक्ष तथा कार्यक्रमहरु

- नगरपालिकाको कार्यालय भवन : १ वटा
- वडा कार्यालयहरु : १० वटा
- कलेजहरु : ७ वटा
- शिशु स्याहार केन्द्रहरु : ६ वटा
- खवप अस्पताल : १ वटा
- जनस्वास्थ्य : २ वटा
- शहरी जनस्वास्थ्य केन्द्र : २ वटा
- जनज्योति पुस्तकालय : १ वटा



जनसंख्या विवरण - २०६८

कुल जनसंख्या : ८३,६५८

क) पुरुष संख्या : ४२,६७८

ख) महिला संख्या: ४०,९८०

जनसंख्या वृद्धिदर : १.६८

घरधुरी संख्या : १७,६५५

जनघनत्व : १२.७५३

औसत परिवार संख्या : ६

मुख्य जात,जातिहरु : नेवार

उचाई समुद्रको सतहबाट करिव १,३५० मिटर

आ व २०७८।७९ को बार्षिक बित्तिय प्रगति अवस्था

क्र.सं.	बिषय क्षेत्र	अनुमानित आय	चालु			पुर्जित		
			आय	खर्च	प्रगति प्रतिशत	आय	खर्च	प्रगति प्रतिशत
१	नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान							
	समानीकरण	224,600,000	224,600,000		100			
	सशर्त अनुदान	395,088,000	382,425,250	354,422,406	92.68	6,250,000	6,196,575	99.15
	समपुरक अनुदान	11200000				5,600,000	-	0
	विशेष अनुदान	33,200,000				33,200,000	32,793,816	98.78
	सामाजिक सुरक्षा	283,443,147	283,443,147	280,035,542	98.8			
	अन्य सडक बोर्ड	8,500,000				8,500,000	8500000	100
२	बागमति प्रदेशबाट प्राप्त अनुदान							
	समानीकरण	19,919,000	19,919,000	19,919,000	100			
	सशर्त अनुदान	23,440,000	2,840,000	2,150,772	75.73	20,600,000	18,346,983	89.06
	समपुरक अनुदान	27,901,000				27,901,000	19,032,950	68.22
	विशेष अनुदान	6,000,000				6,000,000	4,331,573	72.19
		30,000,000				34,036,162	34,036,162	100

आ व २०७८।७९ को बार्षिक बित्तिय प्रगति अवस्था

क्र सं	बिषय क्षेत्र	अनुमानित आय	चस्	
			आय	प्रगति प्रतिशत
३	ग) राजस्व बाँडफाँड			
	सघ	74,686,000	85,990,767	115.14
	प्रदेश	27,532,701	29,300,365	106.42
४	घ) आन्तरिक			
	जिस स नगद	400,000	0	0
	आन्तरिक श्रोत नगद	559,821,299	297175729	53.08
	आन्तरिक श्रोत ऋण	200,000,000	300000000	15

7

आ व २०७८।७९ को बित्तिय प्रगति अवस्था

बिषयगत क्षेत्रको लक्ष्य तथा यथार्थ खर्च

क्रसं	विषयगत क्षेत्र	विनियोजित बजेट	बार्षिक यथार्थ खर्च	खर्च प्रतिशत
१	भौतिक पूर्वाधार विकास	४०,६२,३७,६३०।*	१५,३७,६५,२९५।	३७।८५
२	सामाजिक विकास	७८,७७,८६,३६९।	६६,६२,८६,२७०।	८४।५८
३	आर्थिक विकास	२,६८,००,०००।**	१२,००,०००।	४।४८
४	सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्र विकास	७०,००,०००।	४६,९७,६८३।	६७।११
५	कार्यालय संचालन तथा प्रशासनिक	४५,९७,१४,०००।	३३,८१,६८,४९६।	७३।५६
	कूल जम्मा	१६८,७५,३८,०००।	११६,४१,१७,७४५।	६८।९८

* देको मिवा आयोजनाको लागि ऋण समेत देखाइएको

** उद्योग सहकारी पशुपन्छि विकासमा कार्यक्रम नदेखिएको

8

योजनागत भौतिक तथा आर्थिक

प्रगति

सि. नं.	योजना विवरण	योजना संख्या	योजनाहरूको कुल अनुमानित लागत	भौतिक प्रगति	गत आ. व. को आर्थिक प्रगति
क	क्रमागत योजना				
१	नगरस्तरीय भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधार	१०	४,८८,७३,३२२।	४ सम्पन्न ६ चालु	१३,४३,३२,९३६।
२	नगरस्तरीय सम्पदा जिर्णोद्धार	८	१२,६०,१४,१३०।	५ सम्पन्न ५ चालु	३,०८,०५,४३६।

योजनागत भौतिक तथा आर्थिक

प्रगति

सि. नं.	योजनाको विषयगत शिर्षक	योजना संख्या	कुल अनुमानित लागत	भौतिक प्रगति	आर्थिक	
					खर्च	प्रगति प्रतिशत
ख	चालु योजना					
	संधिय विशेष अनुदान	१	३,६५,००,०००।	सम्पन्न	३,०८,०५,४३६।	८४।४
	संधिय समपुरक अनुदान रिटर्नर गर्दा पनि प्रभावकारी बोलपत्र नपरेको	१	२,५६,२५,८६३।	रद्द	०।०	०।०
	प्रदेश समपुरक अनुदान	२	७,४६,६३,१८७।	१ सम्पन्न १ चालु	१,९५,६७,२४९।	२६।२१
	प्रदेश विशेष अनुदान	१	७३,१९,०६९।	चालु	४१,८७,१३८।	५७।२१
	प्रदेश सशर्त अनुदान	९	१९१६७९१७।	५ सम्पन्न २ चालु २ रद्द	१,८५,०३,९५७।	९६।५४
	प्रदेश सांसद कोष कार्यक्रम पूर्वाधार विकास	१३	३,५०,८१,८४४।	८ सम्पन्न ५ चालु	३,३८,६६,४४६।	९६।५४
	सडक बोर्ड	११	१,१९,४०,९२१।	११ सम्पन्न	१,१६,९०,७५५।	९७।९०
	प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम		६७,७९,०००।	सम्पन्न	५९,२८,९७३।	६४।०३
	सम्पदा संरक्षण	४	१,९७,२७,५०४।	१ सम्पन्न २ चालु १ रद्द	१,१९,६५,६५०।	६०।६५
	आन्तरिक श्रोतबाट ब्यहोर्ने स साना समेत बिबिध	३०	४,४५,५०,९५९।	११ सम्पन्न १४ चालु ५ रद्द	२,६३,६७,८४७।	५९।१९
	मर्मत कार्य बिबिध		८९,३४,६९८।	सम्पन्न	६९,६१,७०६।	७७।९२

क्षेत्रगत भौतिक प्रगतिकोअवस्थः


क्र.सं.	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	इकाइ परिमाण	भौतिक प्रगति	प्रमुख उपलब्धी
१	सडक	कालोपत्रे । ढलान	१।९६ कि मि ०।०६१ कि मि		
		ग्रावेल	०।६८ कि मि		
		ढुंगा छपाइ	०।४३५ किमि		
		इटा । ब्लक छपाइ	०।५२२ किमि ०।१९० कि मि		
२	पुल निर्माण	मोटेरेवल पुल	१ वटा	सम्पन्न	
३	पार्क निर्माण	बाल उद्यान	१ वटा	९० % सम्पन्न	
४	खानेपानी तथा ढल निर्माण	पाइप लाइन	१३ कि मि पाइप ०।१५ किमि ढल	८० % सम्पन्न	
		ट्यांकी	१ वटा	सम्पन्न	
५	नदी नियन्त्रण	खोला सुधार	०।६३ कि मि	सम्पन्न	
६	पोखरी	पोखरी पुननिर्माण	१ वटा	सम्पन्न	
७	फोहरमैला व्यवस्थापन	डम्पिङ साइट	१ वटा	सम्पन्न	
		नयाँ मेशिनरी जडान	२ वटा	सम्पन्न	
८	भवन निर्माण	अस्पताल	१ वटा	सम्पन्न	१०० वेड अनुमति प्राप्त
९		स्वास्थ्य चौकी	२ वटा	१ सम्पन्न १ चालु	
१०	सामुदायिक भवन	कभर्ड हल	२ संख्या	१ सम्पन्न १ चालु	

क्षेत्रगत भौतिक प्रगतिकोअवस्थः


क्र.सं.	विषय क्षेत्र	उपक्षेत्र	इकाइ परिमाण	भौतिक प्रगति	प्रमुख उपलब्धी
११	सम्पदा संरक्षण क्रमागत २ वडास्तरीय समेत	मन्दिर	४ वटा	१ सम्पन्न ३ चालु	
		द्योक्षे	२ वटा	२ चालु	
		सत्तल	१ वटा	चालु	
		पोखरी	१ वटा	सम्पन्न	
		ढुङ्गेधारा	१ वटा	सम्पन्न	
		इनार	१ वटा	सम्पन्न	
		पाटी	२ वटा	चालु	

विकास निर्माण र सम्पदा संरक्षणमा भनिएको प्रयत्नका कही झलकहरु


ऐतिहासिक सम्पदाहरुको जिर्णोद्धार कार्य

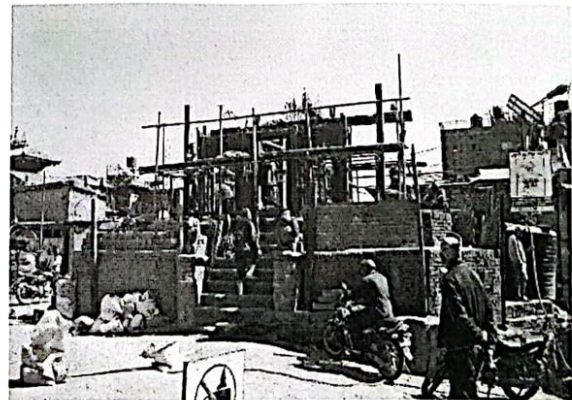

ऐतिहासिक पोखरीहरुको पुनःनिर्माण

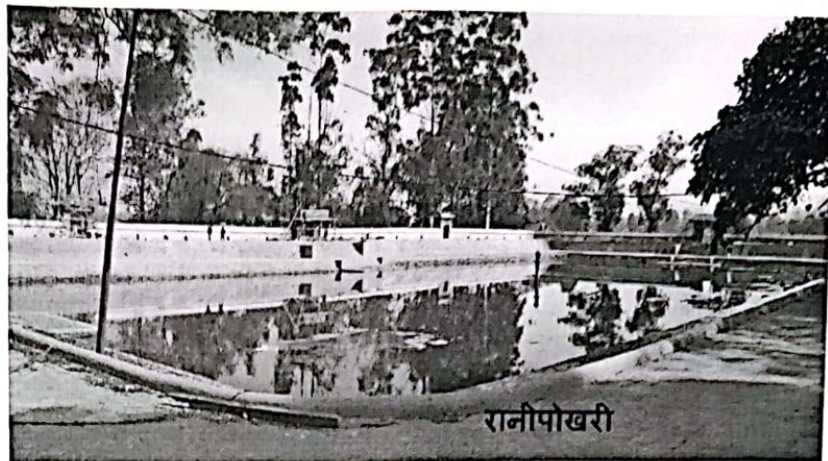

रानीपोखरी

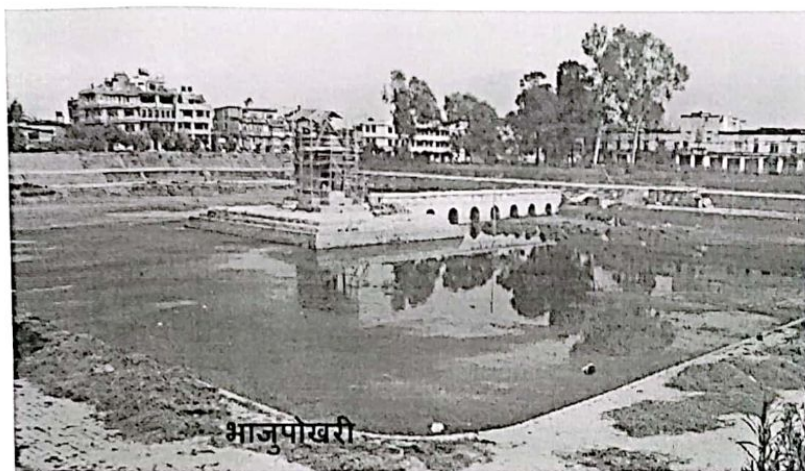


भाजुपोखरी

भवन निर्माण कार्यका केही दृश्य




खवप अस्पताल निर्माण

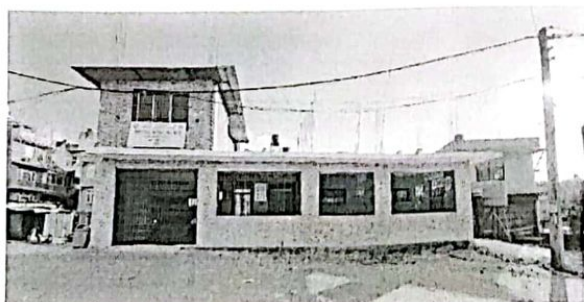

वडा स्वास्थ्य चौकी निर्माण




उक तथापलु निर्माण कार्य केही दृश्य

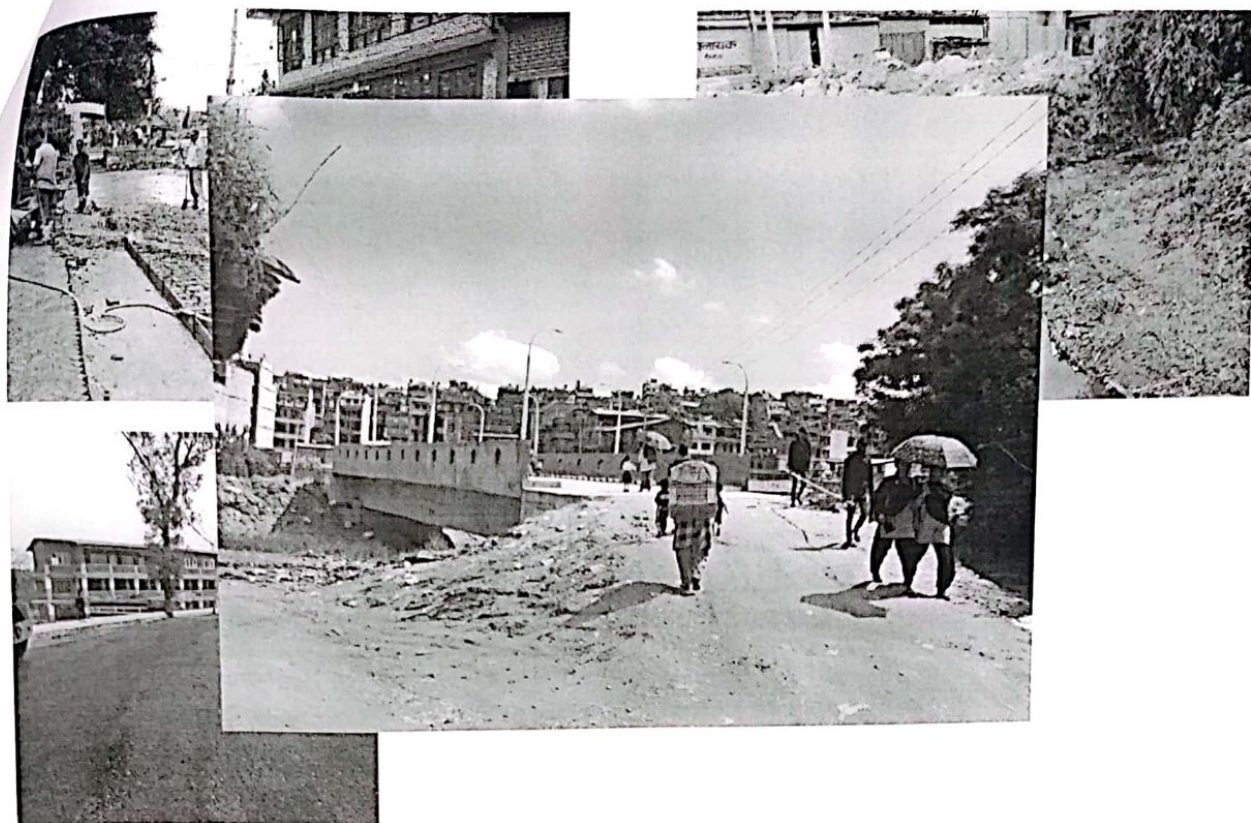


अन्य निर्माण



सधुरिएको शवदाहगृह निर्माण

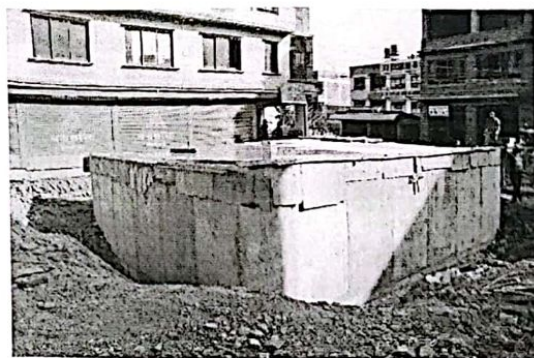

डिप बोरिङ तथा पानी ट्यांकी निर्माण

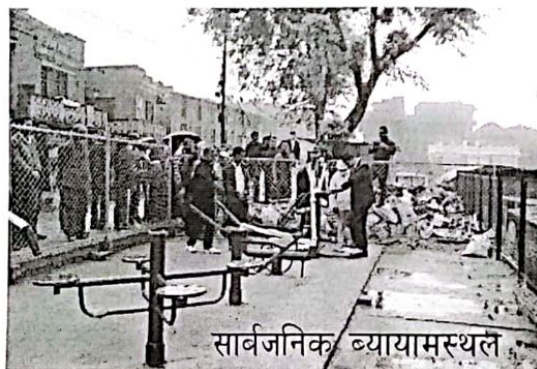

सार्वजनिक व्यायामस्थल

बाल उद्यान



असल अभ्यास । अनुकरणिय कार्यहरु

- स्वायत्तताको अभ्यास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाई र सम्पदा संरक्षण सम्बन्धी उल्लेखनिय कार्य ।
- अन्य स्थानिय तहहरुबाट समेत अध्ययन र अवलोकनको सिलसिला जारी ।
- सर्वसाधारणसमेतका लागि न्यूनतम शुल्कमा शिशु स्याहारदेखि बिश्वविद्यालयसम्मको शिक्षामा पहुच सुनिश्चत गर्ने अभियान । भक्तपुर नगरपालिका अन्तर्गत ७ वटा कलेजहरु संचालन भइरहेको ।
- खप बिश्वविद्यालयको पूर्वाधार तयार भई स्वीकृतिको प्रकृत्यामा ।
- कक्षा १ देखि सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम खपको पहिचान तयार गरी पठनपाठन भैरहेको
- नगरवासीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न शैक्षिक ऋण प्रदान (आ व २०७८ । ७९ का लागि १०४ जना) । इतिहास, भुगोल, नेपालभाषा समेतका विषयमा पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान
- १०० शैयाका खप अस्पतालको स्वीकृति प्राप्त गरी **बिशेषज्ञ सेवासहित बहिरंग सेवा निरन्तरता र अन्तरंग सेवा शुरु ।**
- घरदैलो नर्सिङ सेवा संचालन र आदर निकेतन भवनको निर्माण शुरु ।
- २०७२ सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ११६ सम्पदाहरुमध्ये बिबाद रहेका एकाध बाहेक करीव सबैको जिर्णोद्धार कार्य सम्पन्न (बैदेशिक सहयोग बिना)
- स्थानिय ब्यवस्थापिकाको सक्रिय अभ्यास (आवश्यक स्थानिय कानुन कार्यविधिहरु निर्माण)
- योजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिहरुको अधिकतम परिचालन ।
- पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रबर्धन गर्न नियमित रुपमा भक्तपुर मासिक र खप पौ (नेवारी भाषा) पाक्षिक, स्थानिय राजपत्र प्रकाशन भैरहेको ।

प्रमुख समस्याहरु र चुनौतिहरु

- खानेपानीको श्रोतको अभाव र बितरणमा समस्या ।
- फोहरमैलाको अन्तिम ब्यवस्थापनको लागि ल्याण्डफिल्ड साइटको अभाव
- नगर क्षेत्रको ढल निकास उपचार पोखरी (Treatment Pond) को लागि स्थानको ब्यवस्था भएपनि हालसम्म संचालन हुनु नसकेको ।
- हनुमन्ते र खासाङ्सुङ् खोलाको प्रदुषण नियन्त्रण हुन नसकेको ।
- कोभिड-१९ को कारण साधन स्रोतको अभाव ।
- पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र भईकन पनि पर्यटकीय बसाई लम्ब्याउने स्तरीय होटल र सेवा सुबिधाको बिस्तार हुन नसकेको ।
- रोजगारी क्षेत्रको अपेक्षित बृद्धि हुन नसकेको
- पार्किङ तथा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या ।
- स्थानिय सरकारको भूमिकासंगै थुप्रै दायित्व बढेको तर श्रोत साधन सो अनुरूप नबढेको
- केन्द्र, प्रदेश र संघको योजना छनौट प्राथमिकता र सिलिंग निर्धारणको मापदण्ड नभएकोले श्रोत परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको ।
